

































































| Id | | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | ene 2 '22 | | | | | | | | | | | | | | ene 9 '22 | | | | |
|----|---|---|--|-----------------|--------------------|--------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|--|--|--|--|
| | | | | | | | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | | | | |
| 1 |  |  | Start of construction | 0 días | lun 1/3/22 | lun 1/3/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | |  | Construction of prefabricated bridge by manufacturer in GLULAM - Trusses connection and adequations for full operation (Superstructure) | 20 días | lun 1/3/22 | vie 1/28/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 |  |  | Structure in laminated wood | 5 días | lun 1/3/22 | vie 1/7/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | |  | Metal attachments trusses - Joints | 5 días | lun 1/10/22 | vie 1/14/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | |  | Cross - lam slab: Thickness of 60 mm - Connection to | 4 días | lun 1/17/22 | jue 1/20/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | |  | Liquid pesticide applied for conservation of wooden structures | 2 días | vie 1/21/22 | lun 1/24/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | |  | Solid wax layer dissolved with suitable thinners | 2 días | mar 1/25/22 | mié 1/26/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | |  | Walnut mordant diluted - On exposed wood | 2 días | jue 1/27/22 | vie 1/28/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 |  |  | Construction of foundations | 2,5 días | jue 1/27/22 | lun 1/31/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | |  | Excavation of foundation | 12 horas | jue 1/27/22 | vie 1/28/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|----------------------|---|---------------------------|---|-----------------|---|
| Proyecto: Activities Piedicavallo Fecha: mié 8/18/21 | | Tarea |  | Resumen inactivo |  | Tareas externas |  |
| | | División |  | Tarea manual |  | Hito externo |  |
| | | Hito |  | solo duración |  | Fecha límite |  |
| | | Resumen |  | Informe de resumen manual |  | Progreso |  |
| | | Resumen del proyecto |  | Resumen manual |  | Progreso manual |  |
| | | Tarea inactiva |  | solo el comienzo |  | | |
| | | Hito inactivo |  | solo fin |  | | |


| Id |  | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | ene 2 '22 | | | | | | | | | | | | | | ene 9 '22 | | | | |
|----|---|---|---|------------------|--------------------|-------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|--|--|--|--|
| | | | | | | | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | | | | |
| 11 | |  | Transportation of soil material - Cleaning of terrain | 2 días | jue 1/27/22 | vie 1/28/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | |  | Pouring of structural lightweight concrete | 4 horas | lun 1/31/22 | lun 1/31/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 |  |  | Assembling of superstructure in substructure | 1 día | lun 1/31/22 | mar 2/1/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | |  | Plates connected with bolts over the concrete substructure for joint connection with superstructure | 2 horas | lun 1/31/22 | lun 1/31/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | |  | Loading - Transportation - Unloading in precise places of joints the superstructure into | 3 horas | lun 1/31/22 | lun 1/31/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | |  | Final details proper joint connection, Bolting and welding of joints | 3 horas | lun 1/31/22 | mar 2/1/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | |  | Safety and other details | 0,75 días | mar 2/1/22 | mar 2/1/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | |  | Elaboration of stainless steel fence at the sides of the bridge | 4 horas | mar 2/1/22 | mar 2/1/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | |  | Final cleaning | 2 horas | mar 2/1/22 | mar 2/1/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | |  | Endo of construction | 0 días | mar 2/1/22 | mar 2/1/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Proyecto: Activities Piedicavallo
Fecha: mié 8/18/21

| | | | | | |
|----------------------|---|---------------------------|---|-----------------|---|
| Tarea |  | Resumen inactivo |  | Tareas externas |  |
| División |  | Tarea manual |  | Hito externo |  |
| Hito |  | solo duración |  | Fecha límite |  |
| Resumen |  | Informe de resumen manual |  | Progreso |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual |  | Progreso manual |  |
| Tarea inactiva |  | solo el comienzo |  | | |
| Hito inactivo |  | solo fin |  | | |

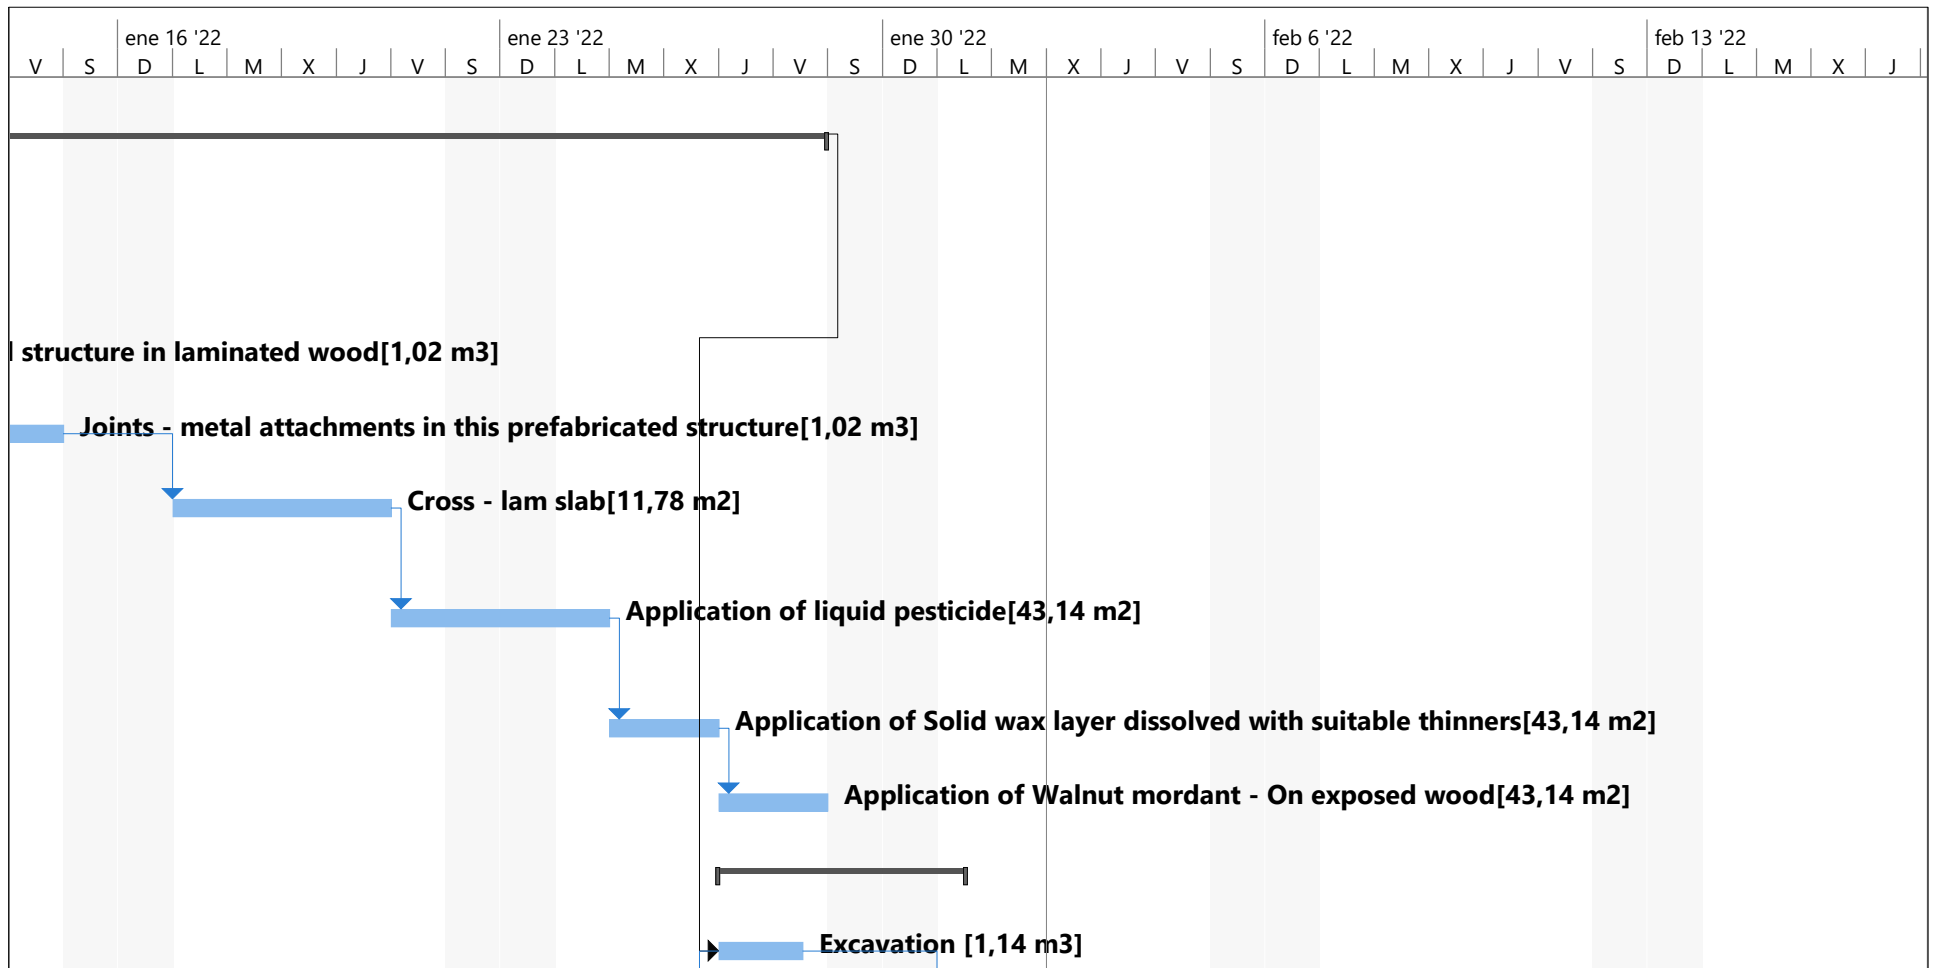

| | | | | | | |
|---|----------------------|--|---------------------------|--|-----------------|--|
| Proyecto: Activities Piedicavallo Fecha: mié 8/18/21 | Tarea | | Resumen inactivo | | Tareas externas | |
| | División | | Tarea manual | | Hito externo | |
| | Hito | | solo duración | | Fecha límite | |
| | Resumen | | Informe de resumen manual | | Progreso | |
| | Resumen del proyecto | | Resumen manual | | Progreso manual | |
| | Tarea inactiva | | solo el comienzo | | | |
| | Hito inactivo | | solo fin | | | |
| | | | | | | |

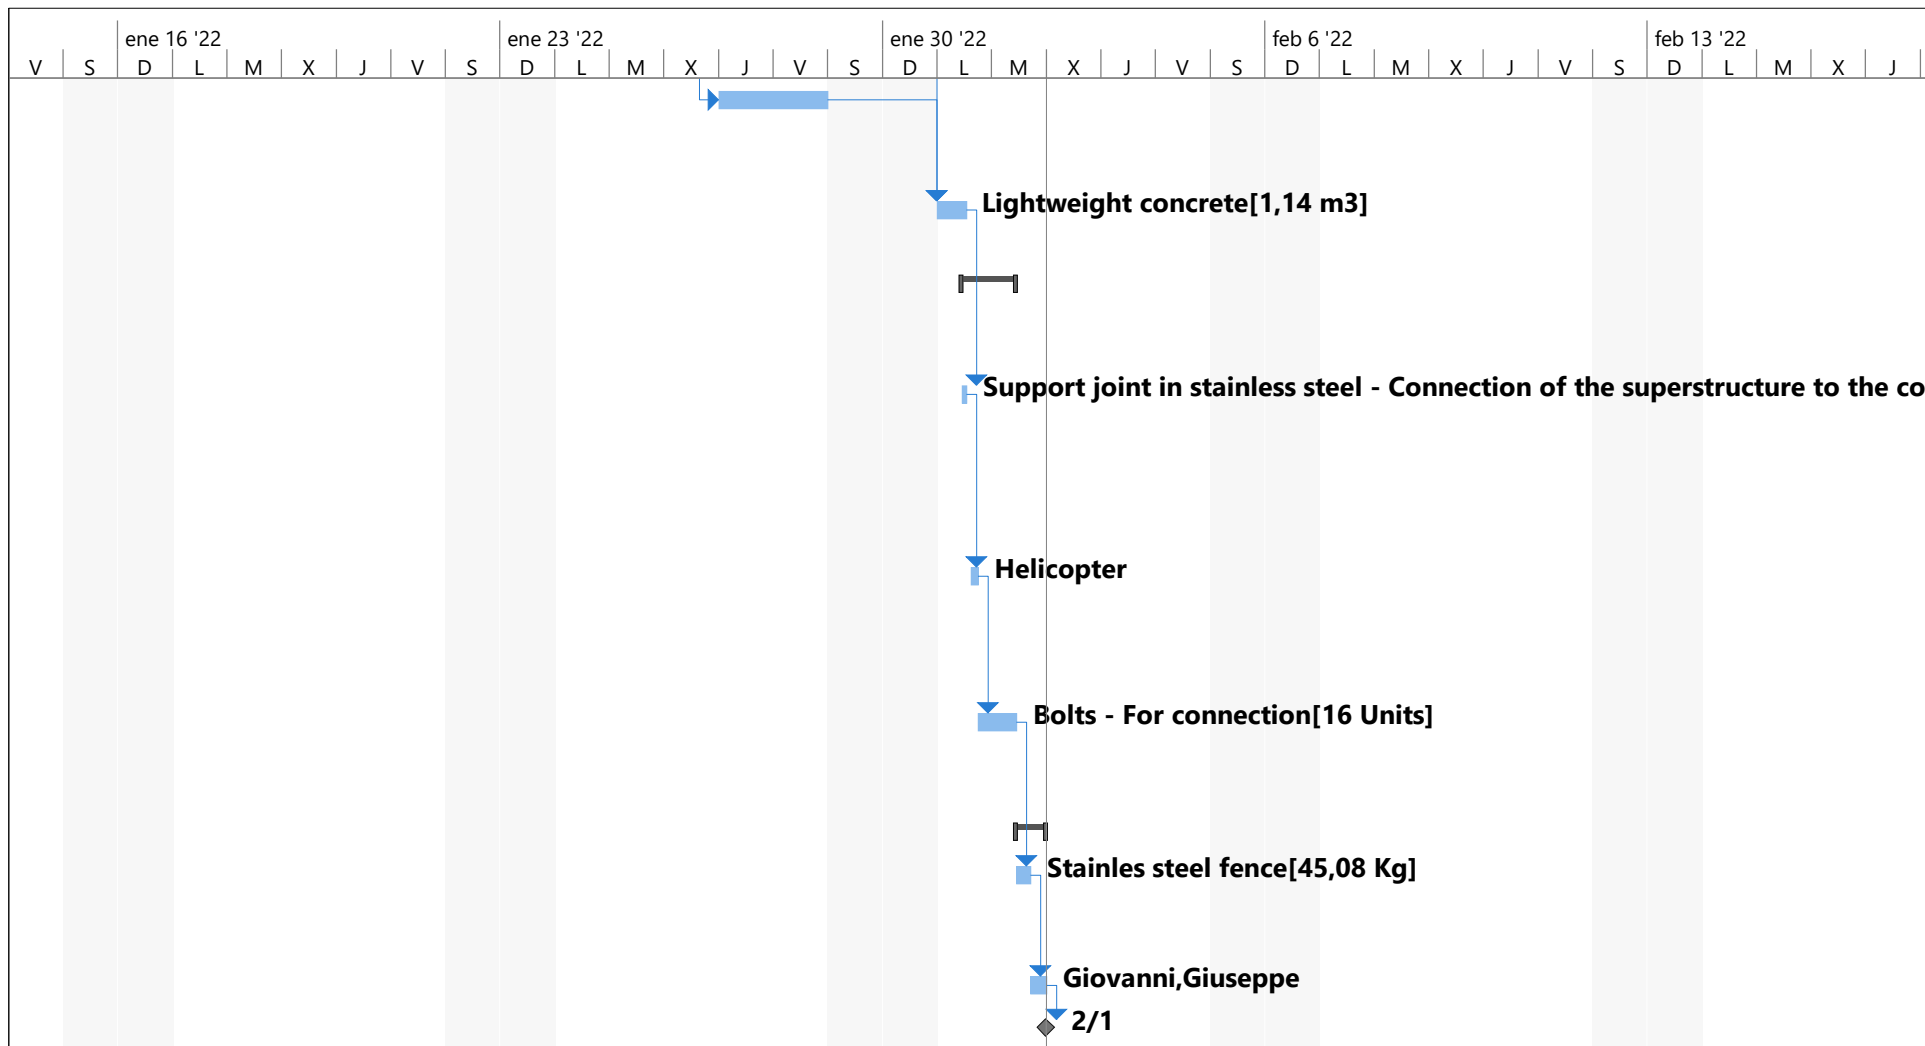

Proyecto: Activities Piedicavallo
Fecha: mié 8/18/21

| | | | | | |
|----------------------|--|---------------------------|--|-----------------|--|
| Tarea | | Resumen inactivo | | Tareas externas | |
| División | | Tarea manual | | Hito externo | |
| Hito | | solo duración | | Fecha límite | |
| Resumen | | Informe de resumen manual | | Progreso | |
| Resumen del proyecto | | Resumen manual | | Progreso manual | |
| Tarea inactiva | | solo el comienzo | | | |
| Hito inactivo | | solo fin | | | |
